

Тестовое задание
на позицию Бизнес-аналитик

Тема:
AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

Вопросы, которые я задал бы в первую очередь

Ниже вопросы, с которых я бы начал работу. Смысл в том, чтобы как можно раньше снять неопределенность по границам пилота, критичным правилам и критериям качества.

1. Какие именно ошибки в текущем процессе для бизнеса самые болезненные?
Кому: заказчик, руководитель процесса, казначейство.
Зачем: понять, что бьет сильнее всего по процессу: отказ банка, потеря времени, повторная сборка пакета, просрочка, репутационные риски.
Какой риск закрываем: риск сделать пилот вокруг “интересных” функций, а не вокруг реальной боли бизнеса.

2. По каким причинам банк чаще всего отказывает или возвращает документы на доработку?
Кому: казначейство, сотрудники, которые готовят пакеты в банк.
Зачем: собрать не общую картину, а конкретные причины отказов, на которых стоит строить MVP.
Какой риск закрываем: риск формализовать не те правила и упустить самые частые ошибки.

3. Какие проверки считаются стоп-факторами, после которых платеж точно нельзя заявлять?
Кому: казначейство, юристы, владелец процесса.
Зачем: разделить проверки на три класса: стоп-фактор, предупреждение, ручная интерпретация.
Какой риск закрываем: риск того, что система будет либо слишком жесткой, либо слишком “смелой” в положительном решении.

4. Какие документы обязательны в зависимости от типа кейса?
Кому: казначейство, бухгалтерия, юристы.
Зачем: понять, есть ли единый пакет или набор документов зависит от сценария: аванс, постоплата, товар, услуги, федеральная программа, областная программа.
Какой риск закрываем: риск построить одну общую логику комплектности там, где на самом деле нужна матрица сценариев.

5. Что для бизнеса важнее на пилоте: минимизировать пропуск критичных нарушений или снизить число ручных проверок?
Кому: заказчик, руководитель процесса.

Зачем: зафиксировать главный приоритет. По описанию кейса я предполагаю, что важнее не пропустить запрещенный платеж, даже ценой большего числа кейсов “требуется ручная проверка”.

Какой риск закрываем: риск, что команда начнет оптимизировать скорость и процент авторазбора в ущерб качеству.

6. Какие данные обязательно должны извлекаться из каждого документа, чтобы дальше можно было применять правила?

Кому: казначейство, бухгалтерия, IT, команда разработки.

Зачем: сформировать рабочую модель данных: сумма, даты, контрагент, номенклатура, количество, предмет договора, приложение, подписи, печати и т.д.

Какой риск закрываем: риск начать разработку OCR/парсинга без согласованного набора обязательных полей.

7. Какой документ или источник считается финальным источником истины по правилам льготной программы?

Кому: юристы, заказчик, казначейство.

Зачем: зафиксировать, из чего именно будут формализовываться правила: кредитный договор, регламент банка, внутренний чек-лист, условия программы.

Какой риск закрываем: риск конфликтов между трактовками разных подразделений.

8. Какие примеры “сложных” или спорных кейсов уже были, где сотрудники не сразу понимали, можно ли заявлять платеж?

Кому: казначейство, руководитель процесса.

Зачем: собрать кейсы для ручной проверки и заранее понять, где AI-агент не должен принимать решение автоматически.

Какой риск закрываем: риск того, что пилот будет хорошо работать только на простых кейсах.

9. Где физически будут жить документы в рамках пилота и как пользователь будет запускать проверку?

Кому: заказчик, IT-департамент.

Зачем: понять практический контур пилота: web-интерфейс, папка, сетевой ресурс, файловое хранилище, S3-совместимое хранилище.

Какой риск закрываем: риск собрать решение, которое неудобно встроить даже в пилотный контур.

10. Кто будет разбирать кейсы со статусом “требуется ручная проверка” и как быстро по ним нужно принимать решение?

Кому: руководитель процесса, казначейство.

Зачем: заранее спроектировать не только автоматическую часть, но и операционный маршрут спорных заявок.

Какой риск закрываем: риск, что система будет генерировать спорные кейсы, но процесс их обработки останется неорганизованным.

Описание ключевого бизнес-процесса

Я бы описал для пилота процесс первичной проверки пакета документов перед заявлением авансового платежа в банк. На мой взгляд, это наиболее важный сценарий для MVP, потому что именно здесь цена ошибки максимальная: если платеж заявлен неверно, последствия наступают до того, как банк примет решение.

1. Цель процесса

До отправки документов в банк проверить, соответствует ли пакет условиям льготной программы, и не допустить ошибочного заявления платежа.

2. Участники

- Специалист казначейства
- AI-агент
- Руководитель / контролер процесса

3. Входы

- договор
- спецификация
- счет
- УПД / акт, если документ нужен на этой стадии
- условия льготной программы
- выбранный тип программы

4. Выходы

- “можно заявлять в банк”
- “нельзя заявлять в банк”
- “требуется ручная проверка”
- краткое пояснение по результату

5. Как я вижу логику процесса

Сейчас специалист фактически держит у себя в голове набор правил и вручную проверяет пакет документов. Это работает, пока объем невысокий и сотрудник опытный. Как только документов становится много, а часть кейсов похожи друг на друга, резко растет риск ошибки.

В целевом процессе AI-агент не заменяет специалиста полностью, а берет на себя рутинную и повторяемую часть:

- проверяет комплектность,
- сверяет формальные реквизиты,
- проверяет сроки,
- ищет явные несоответствия,

- подсвечивает зоны риска.

При этом агент не должен “додумывать” решение там, где качество распознавания недостаточное или бизнес-правило не формализовано. В таких случаях правильнее отдать кейс на ручную проверку.

6. Пошаговое описание процесса

Шаг 1. Специалист собирает пакет документов по платежу.

Шаг 2. Загружает пакет в систему и выбирает льготную программу, по которой нужно провести проверку.

Шаг 3. Система распознает документы и извлекает ключевые поля: контрагент, сумма, дата, предмет оплаты, номенклатура, количество, сроки, ссылки на приложения, признаки наличия подписи и печати.

Шаг 4. Агент определяет, все ли обязательные документы приложены именно для этого сценария.

Шаг 5. Агент применяет формальные проверки:

- соответствие предмета оплаты программе,
- отсутствие просрочки,
- наличие обязательных реквизитов,
- логическую связность договора, спецификации и счета,
- наличие подписей и печатей, если они обязательны для кейса.


Шаг 6. Если найден критичный стоп-фактор, система выдает статус “нельзя заявлять в банк”.

Шаг 7. Если стоп-фактора нет, но часть полей не распознана, есть сомнение в трактовке или не хватает уверенности, система выдает “требуется ручная проверка”.

Шаг 8. Только если обязательные проверки пройдены без замечаний, система выдает “можно заявлять в банк”.

Шаг 9. Специалист либо отправляет пакет дальше, либо дорабатывает документы, либо эскалирует кейс руководителю / контролеру.

Схема процесса

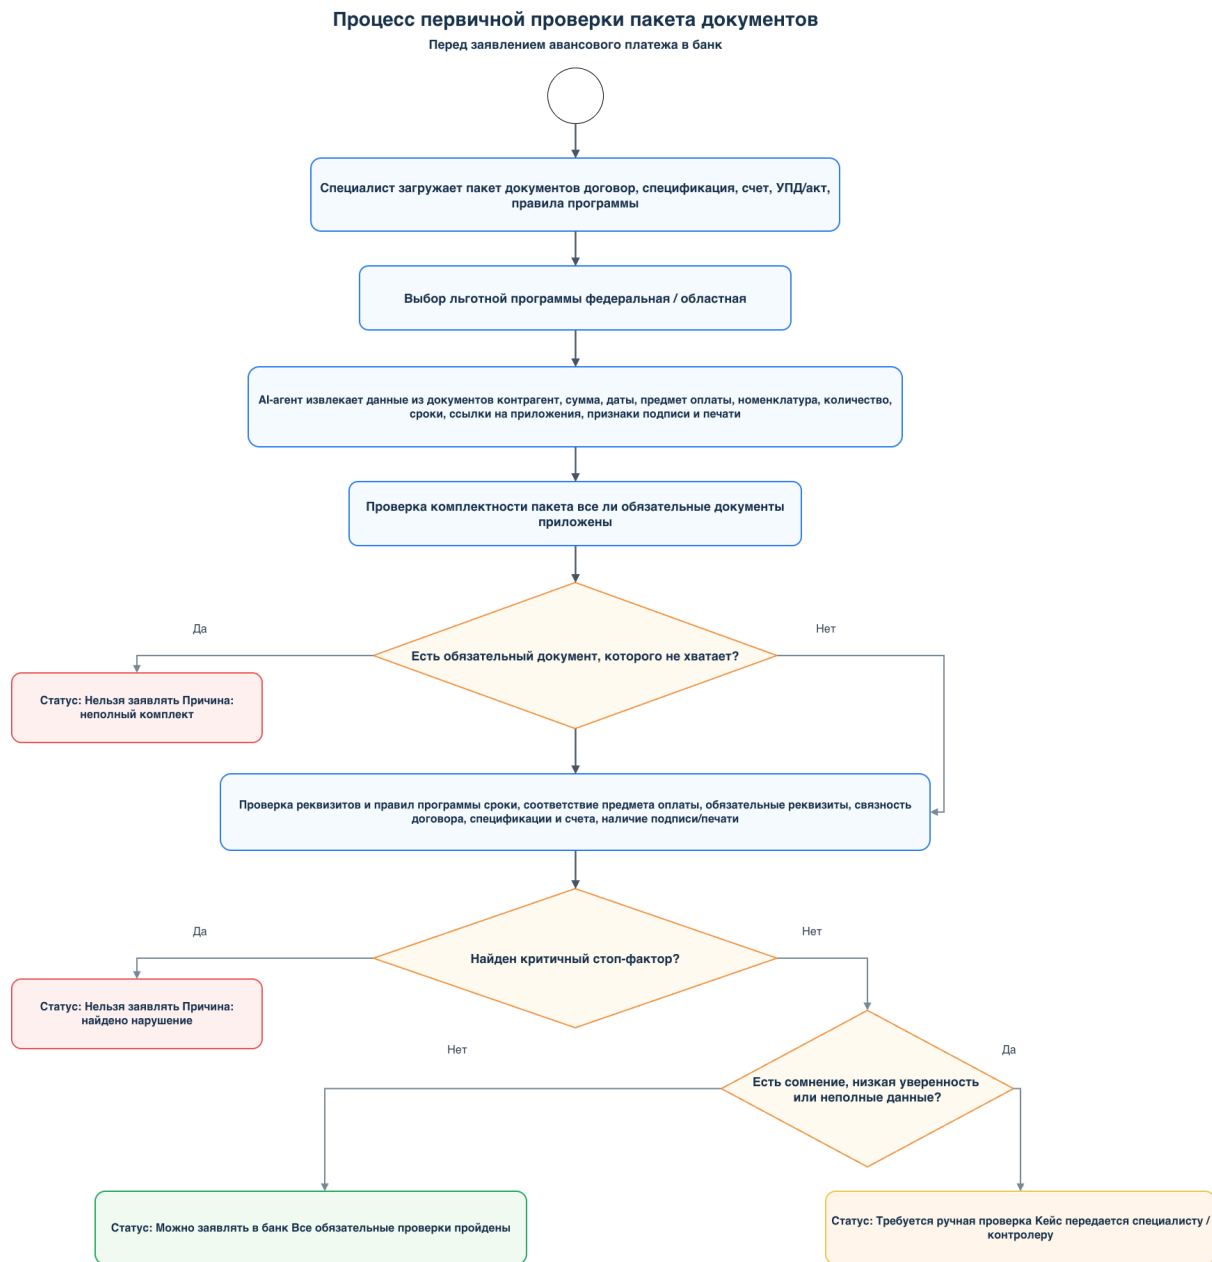

Дорожная карта пилота на 2 месяца

Я бы не пытался за 2 месяца сделать “все и сразу”. Для такого пилота важнее быстро прийти к работающему сценарию, который уже снижает риск, чем распыляться на большой функционал.

Ниже дорожная карта, которую я считаю реалистичной для пилота.

Веха 1. Старт проекта и фиксация рамок пилота

Срок: 1 неделя

Что делаем:

- kick-off;
- согласуем цели пилота;
- уточняем список сценариев, которые точно входят в MVP;
- собираем документы и примеры реальных кейсов.

Критерии готовности:

- есть согласованный score пилота;
- есть список обязательных сценариев;
- есть набор тестовых документов от клиента;
- есть согласованные метрики пилота.

Кто вовлечен:

- заказчик;
- казначейство;
- юристы;
- БА / PM;
- Tech Lead.

Основной риск:

Команда начнет двигаться без четких границ пилота.

Что бы я сделал(а):

Зафиксировал(а) бы результат недели отдельным документом: score, out of score, критерии приемки.

Веха 2. Формализация правил и подготовка тестового набора

Срок: 2 неделя

Что делаем:

- описываем бизнес-правила;
- строим матрицу “сценарий -> обязательные документы -> проверки”;
- формируем эталонные кейсы;
- согласуем, какие нарушения считаются критичными.

Критерии готовности:

- есть список правил для MVP;
- есть эталонные результаты по тестовым кейсам;
- есть понятный перечень стоп-факторов и спорных кейсов.

Кто вовлечен:

- БА;
- казначейство;
- юристы;
- AI Engineer / DS;

- Backend.

Основной риск:

Правила останутся в полусвободной форме и будут трактоваться по-разному.

Что бы я сделал(а):

Все спорные правила выносил(а) бы на согласование владельцу процесса и юристам, без “молчаливых допущений”.

Веха 3. Технический каркас MVP

Срок: 3 неделя

Что делаем:

- поднимаем минимальный интерфейс загрузки документов;
- организуем хранение файлов и результатов;
- настраиваем пайплайн распознавания;
- делаем базовый запуск проверки.

Критерии готовности:

- документы можно загрузить;
- система запускает обработку;
- результат обработки сохраняется;
- пользователь видит базовый статус.

Кто вовлечен:

- Backend;
- Frontend;
- AI Engineer;
- IT / инфраструктура;
- БА / PM.

Веха 4. Реализация первичных бизнес-проверок

Срок: 4-5 недели

Что делаем:

- комплектность документов;
- обязательные реквизиты;
- базовые проверки сроков;
- статусная модель: можно / нельзя / ручная проверка;
- текст причины результата.

Критерии готовности:

- на тестовых кейсах система отрабатывает основные проверки;
- критичные нарушения не получают положительный статус;
- есть объяснение причины по результату проверки.

Кто вовлечен:

- Backend;
- AI Engineer;
- QA;
- БА;
- представители казначейства.

Основной риск:

Агент будет слишком часто давать либо ложноположительный, либо слишком “осторожный” ответ.

Что бы я сделал(а):

Сразу анализировал(а) бы матрицу ошибок и не пытался(ась) искусственно снижать число ручных проверок, если это ухудшает бизнес-безопасность.

Веха 5. Пользовательская обкатка и пост-контроль по авансам

Срок: 6-7 недели

Что делаем:

- добавляем сценарий проверки закрывающих документов;
- проводим UAT на кейсах клиента;
- уточняем правила и причины ошибок;
- смотрим, где система чаще всего “спотыкается”.

Критерии готовности:

- есть рабочий сценарий пост-контроля для авансов;
- есть результаты UAT;
- понятен список доработок перед приемкой.

Кто вовлечен:

- казначейство;
- руководитель процесса;
- QA;
- команда разработки;
- БА / РМ.

Веха 6. Финальная приемка и отчет по пилоту

Срок: 8 неделя

Что делаем:

- итоговая демонстрация;
- прогон agreed сценариев;
- замер метрик;
- фиксация результатов пилота и предложений по следующему этапу.

Критерии готовности:

- система обрабатывает тестовые пакеты клиента;
- выполняются согласованные критерии приемки;
- есть итоговый отчет по пилоту.

Кто вовлечен:

- заказчик;
- руководитель процесса;
- казначейство;
- БА / РМ;
- Tech Lead.

Как я бы выстраивал(а) работу с заказчиком и командой

Для такого проекта важно не только собрать требования, но и держать очень плотную обратную связь. Здесь много нюансов в трактовке правил, и если их редко обсуждать, команда быстро уедет в неверную сторону.

1. Работа с заказчиком

Kick-off:

1 встреча в начале проекта, 60-90 минут.

Фокус:

- зачем делаем пилот;
- какие риски он должен закрыть;
- что точно входит в первую очередь;
- кто принимает решения по спорным вопросам.

Еженедельный статус:

1 раз в неделю, 30 минут.

Фокус:

- что сделано;
- что в риске;
- какие решения нужны от бизнеса;
- не появился ли scope creep.

Рабочие встречи по правилам:

по необходимости 1-2 раза в неделю.

Фокус:

- разбор кейсов;
- согласование трактовки правил;
- фиксация изменений.

Демо:

раз в 2 недели.

Фокус:

- показывать не презентацию, а работающий кусок процесса;
- быстро получать обратную связь на реальных кейсах.

2. Работа с командой разработки

Daily / короткий sync:

ежедневно 15 минут.

Фокус:

- статус по задачам;
- блокеры;
- что нужно уточнить у бизнеса.

Backlog refinement:

1-2 раза в неделю.

Фокус:

- декомпозиция задач;
- приоритеты;
- критерии готовности;
- понятные acceptance criteria.

Сессии по логике проверок:

по мере реализации.

Фокус:

- одинаково ли понимают правило бизнес и разработка;
- где нужен hard rule, а где ручная проверка.

QA sync:

минимум раз в неделю.

Фокус:

- тест-кейсы;
- дефекты;
- какие сценарии еще не покрыты.

3. Что я считаю важным в коммуникации

Формат сообщений я бы держал(а) коротким и прикладным:

- что сделано;
- что делаем дальше;
- где есть риск;
- что нужно от заказчика.

Без перегруженных отчетов, особенно на пилоте. Если сообщение нельзя быстро прочитать и понять, оно не работает.

4. На чем бы я держал(а) основной фокус

1. Не потерять бизнес-смысл за техническими деталями.

Для пилота важно не просто “распознавать документы”, а снижать риск неправильного заявления платежа.

2. Максимально рано выявлять спорные трактовки.

Лучше потратить 30 минут на уточнение правила, чем потом переделывать часть логики.

3. Жестко контролировать приоритеты.

Если срок 2 месяца, то в первую очередь должны закрываться сценарии с самым большим бизнес-риском.

4. С самого начала держать в поле зрения приемку.

То, что не привязано к измеримому критерию, на приемке почти всегда вызывает вопросы.

Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект?

Мне интересен этот проект, потому что он находится на стыке реального бизнес-процесса, документов, правил и практического применения AI. Это не абстрактная автоматизация, а решение очень прикладной задачи, где результат можно довольно быстро измерить: меньше ошибок, быстрее проверка, меньше зависимости от человеческого фактора.

Отдельно мне нравится, что в этом кейсе AI не предлагается как “замена человека вообще”, а используется там, где он действительно дает эффект: в рутинной проверке, поиске несоответствий и подсветке риска.

Как я вижу свою роль в команде?

Свою роль я вижу как человека, который помогает перевести бизнес-логику в понятную для команды разработку и при этом не теряет цель пилота. Для меня здесь важны три вещи:

- правильно разложить требования;
- быстро снимать неопределенность со стейкхолдерами;
- довести команду до результата, который можно показать и защитить перед заказчиком.

Если говорить проще, я вижу свою роль не только в том, чтобы “собрать требования”, но и в том, чтобы проект двигался без лишней турбулентности и команда все время работала над действительно важными вещами.

Сколько времени я готов(а) уделять проекту?

Готов(а) уделять проекту порядка 15-20 часов в неделю в течение всего пилотного этапа. Если на отдельных участках потребуется больше включенности, например во время активной приемки или серии рабочих сессий по правилам, могу усиливать участие на эти периоды.

Вывод

Если кратко, я бы строил(а) пилот вокруг следующей логики:

- лучше меньше автоматизировать, но не пропускать критичные нарушения;
- спорные кейсы честно отдавать на ручную проверку;
- сначала закрыть самые частые и дорогие ошибки;
- как можно раньше показывать бизнесу работающий сценарий на реальных документах.

На мой взгляд, именно такой подход даст пилоту не “демо-эффект”, а практическую ценность.
